Trabajo Práctico N°02 - Unidad 3 y 4

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumna

Florencia Pezcara

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Martínez Gabriela

Docente Tutor

Gilda Dominguez

02 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos 3

Consignas 4

Desarrollo

Consigna 1 5

Consigna 2 6

Consigna 3 7

Conclusión 9

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 10

Referencias 11

Trabajo Práctico N°02

Introducción

La transformación digital ha impulsado a las organizaciones a utilizar herramientas tecnológicas que permitan optimizar sus procesos y mejorar la toma de decisiones. En este contexto, el presente proyecto propone la implementación de un sistema de A/B Testing mediante PostHog en Funding Circle para analizar el comportamiento de los usuarios y optimizar el proceso de solicitud de préstamos. La implementación de este sistema permitirá transformar los datos obtenidos del comportamiento de los usuarios en información útil para la toma de decisiones, contribuyendo a la mejora continua de la experiencia de usuario y de los procesos digitales de la organización.

Objetivo General

Implementar un sistema de experimentación A/B mediante PostHog en la página de solicitud de préstamos de Funding Circle, con el fin de identificar y desplegar la variante de diseño que maximice la conversión de PyMEs, sin comprometer la estabilidad operativa de la plataforma ni el cumplimiento regulatorio vigente.

Objetivos Específicos

- Analizar el comportamiento de los usuarios durante el proceso de solicitud de préstamos.
- Obtener información confiable para apoyar la toma de decisiones basada en datos.
- Implementar mecanismos de medición y seguimiento mediante métricas y eventos.
- Identificar oportunidades de mejora en la experiencia de usuario a través de experimentos controlados.
- Incrementar la eficiencia del proceso comercial utilizando información obtenida en tiempo real.
- Evaluar el impacto de las mejoras implementadas mediante indicadores de rendimiento y conversión.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Consigna 1: Análisis FODA

Matriz | Análisis FODA

	Aspectos negativos	Aspectos positivos
Análisis interno	**Debilidades** • Complejidad técnica en la implementación y gestión de experimentos. • Mantenibilidad del ruteo dinámico y riesgo de configuraciones obsoletas. • Dependencia tecnológica de proveedores externos. • Limitada disponibilidad de métricas históricas para el análisis inicial.	**Fortalezas** • Capacidad de implementar experimentos sin afectar significativamente la experiencia de navegación de los usuarios. • Mayor foco en el negocio principal mediante herramientas especializadas. • Infraestructura Cloud y CI/CD lista para despliegues. • Cultura organizativa orientada a datos (*Data-Driven*).
Análisis externo	**Amenazas** • Riesgo de latencia adicional en los tiempos de respuesta. • Regulaciones sobre privacidad y uso de datos. • Pérdida de datos de seguimiento por bloqueadores o eliminación de cookies. • Incremento de costos asociado al crecimiento del volumen de eventos.	**Oportunidades** • Presión competitiva fintech que impulsa a mejorar la conversión del embudo. • Mayor digitalización de las PyMEs: más tráfico para experimentar. • Herramientas SaaS de bajo costo (PostHog) sin infraestructura propia. • Regulación (FCA) receptiva al testing ágil si queda documentado.

Interpretación del análisis FODA

El análisis realizado permite concluir que el proyecto presenta condiciones favorables para su implementación, debido a la existencia de una infraestructura tecnológica adecuada y una cultura organizacional orientada al uso de datos, que permiten aprovechar oportunidades del entorno como la presión competitiva del sector Fintech, la creciente digitalización de las PyMEs y la disponibilidad de herramientas SaaS de bajo costo. Asimismo, la utilización de experimentación A/B posibilita optimizar la conversión de solicitudes mediante decisiones basadas en evidencia. No obstante, será necesario gestionar adecuadamente aspectos como la dependencia de proveedores externos, la protección de datos personales y los posibles inconvenientes asociados al seguimiento de usuarios. Por ello, resulta fundamental realizar un seguimiento continuo de la herramienta, mediante pruebas A/A (dos versiones idénticas de la página) que permitan comprobar que funciona correctamente y que sus resultados son fiables antes de tomar decisiones a partir de ellos.

Consigna 2: Objetivos y Metas

Objetivo general:

Implementar un sistema de experimentación A/B mediante PostHog en la página de solicitud de préstamos de Funding Circle, con el fin de identificar y desplegar la variante de diseño que maximice la conversión de PyMEs, sin comprometer la estabilidad operativa de la plataforma ni el cumplimiento regulatorio vigente.

Metas cuantitativas:

- Incrementar la tasa de conversión de solicitudes en al menos 8% respecto de la línea base, medido durante las primeras 4 semanas del experimento.
- El SDK de PostHog no debe agregar más de 200 ms al tiempo de carga de la página de solicitud.
- El sistema debe soportar picos de hasta 5.000 solicitudes concurrentes sin degradación del servicio.
- Completar el ciclo completo (diseño → implementación → prueba → análisis) en un plazo máximo de 11 semanas.
- Alcanzar significancia estadística (confianza ≥95%) con un mínimo de 2.000 solicitudes por variante.
- Reutilizar la suscripción de *PostHog* ya contratada por el área de Marketing como plataforma de analítica del experimento, evitando contratar una herramienta de testing adicional.

Consigna 3: Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)


Para la implementación del módulo de A/B Testing con PostHog se identificaron siete tareas críticas e interdependientes, agrupadas en tres fases: diseño y configuración, desarrollo, y validación e implementación. A continuación se detalla la lista de tareas con sus responsables y precedencias, seguida del diagrama de Gantt correspondiente.

#	Tarea	Responsable	Precedencia
1	Análisis y relevamiento de requerimientos	Product Manager	—
2	Diseño UX/UI de variantes A/B	Diseñador UI/UX	Tarea 1
3	Configuración de PostHog y *Feature Flags*	Equipo DevOps	Tarea 1
4	Codificación e integración del SDK	Devs Frontend	Tareas 2 y 3
5	Pruebas de calidad (QA)	Equipo QA	Tarea 4
6	Implementación / despliegue	Equipo DevOps	Tarea 5
7	Monitoreo y análisis de resultados	Marketing / PM	Tarea 6

Módulo A/B Testing
Funding Circle

Fecha inicio: lu, 5/10/2026

TAREA	RESPONSABLE	INICIO	FIN
Fase 1: Diseño y configuración			
Análisis y relevamiento de requerimientos	Product Manager	05/10/2026	16/10/2026
Diseño UX/UI de variantes A/B	Diseñador UI/UX	19/10/2026	30/10/2026
Configuración de PostHog y feature flags	Equipo DevOps	19/10/2026	06/11/2026
Fase 2: Desarrollo			
Codificación e integración del SDK	Devs Frontend	09/11/2026	20/11/2026
Fase 3: Validación e implementación			
Pruebas de calidad (QA)	Equipo QA	23/11/2026	27/11/2026
Implementación / despliegue	Equipo DevOps	30/11/2026	04/12/2026
Monitoreo y análisis de resultados	Marketing / PM	07/12/2026	18/12/2026

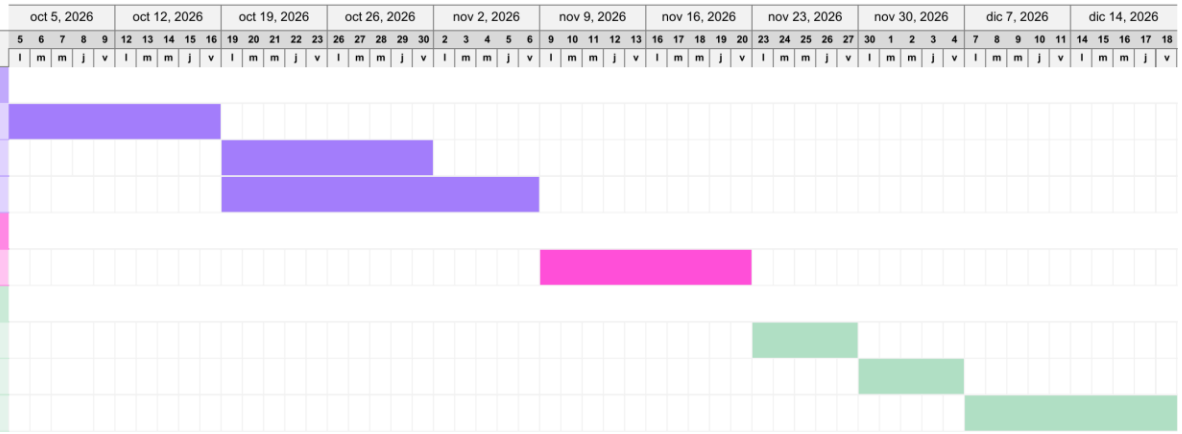

Interpretación del diagrama de Gantt

El proyecto se planificó a lo largo de 11 semanas, desde el 5 de octubre hasta el 18 de diciembre de 2026. Las dependencias entre tareas quedan reflejadas en el orden secuencial de las barras: la Codificación no puede comenzar hasta que finalicen tanto el Diseño UX/UI como la Configuración de PostHog, ya que requiere los insumos de ambas. Durante la fase de pruebas de calidad (QA) se realizará además un test A/A, que consiste en comparar dos versiones idénticas de la página, para validar que la herramienta distribuye a los usuarios y registra los eventos de forma fiable antes del lanzamiento. Asimismo, se recomienda que el avance de cada tarea se actualice de forma semanal, de modo que el equipo pueda detectar desvíos respecto a lo planificado de manera temprana y aplicar acciones correctivas a tiempo.

Conclusión

El módulo de A/B Testing con PostHog es viable para Funding Circle. Cuenta con la infraestructura y una cultura orientada a datos para implementarlo, y el entorno acompaña: las PyMEs se digitalizan cada vez más y existen herramientas de bajo costo. Además, se reutiliza la suscripción de PostHog que ya paga Marketing, así que no hace falta contratar otra herramienta.

Los riesgos principales son la complejidad técnica y la privacidad de los datos. Por eso se planificaron tests A/A para confirmar que la herramienta es confiable antes de decidir con sus resultados.

Con el objetivo, las metas y el cronograma de 11 semanas, el proyecto queda ordenado para pasar a la implementación y transformar los datos de los usuarios en información útil para mejorar la experiencia de solicitud de préstamos.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA: Este trabajo se desarrolló con la asistencia de IA generativa como herramienta de apoyo, bajo la dirección de la autora, quien aportó el contexto del caso, el trabajo anterior (TP1) y el material de la cátedra. La IA se utilizó para proponer borradores y alternativas de redacción (objetivos y metas, interpretación del FODA, conclusión), organizar el contenido bajo el formato de la UTN, sugerir revisiones a la clasificación del análisis FODA y convertir imágenes a alta resolución. La autora evaluó cada propuesta, eligió y corrigió las que correspondían, descartó otras, definió las decisiones de contenido y elaboró la matriz FODA y el diagrama de Gantt en sus propias herramientas. El resultado final fue revisado por la autora, quien se responsabiliza por su veracidad y coherencia conceptual.

Referencias

Bueno Blanco, R.; Ramos Sásamo, M.; Berrelleza Gaxiola, C. (2018). *Elementos Básicos de Administración*. Dirección General de Escuelas Preparatorias. México.

Canosa Ferreiro, A. J. (2024). *SCRUM: teoría e Implementación práctica* (1.ª ed.). RAMA Editorial.

Cruz de Innocente, R. & G de Castro, I. (2010). *Introducción a la Contabilidad*. Editorial ConTexto.

Fowler Newton, E. (2004). *Contabilidad básica* (4.ª ed.). La Ley.

Gibson, J. L., Ivancevich, J. M. & Donnely, J. H. (1996). *Las Organizaciones: Comportamiento, Estructura y Procesos* (8.ª ed.). McGraw-Hill.

Gilli, J. J.; Arostegui; Doval de Antoine; Fovakis; Iesularo. *Sistemas Administrativos: Técnicas y Aplicaciones*. Fundación Universidad a Distancia "Hernandarias".

Hernández Sánchez, J. M. (2016). *Gerencia de proyectos con Project 2013* (2.ª ed.). Ecoe Ediciones.

Kendall, K. E. & Kendall, J. (2005). *Análisis y Diseño de Sistemas* (6.ª ed.). Pearson Educación / Prentice Hall.

Lapiedra Alcamí, R., Devece Carañama, C., Guiral Herrando, J. (2011). *Introducción a la gestión de Sistemas de Información en la empresa*. Universitat Jaume I.

Mano Carrillo, M. S. (2009). *Organigramas*. El Cid Editor.

Rodríguez Cruz, Y. (2015). *Gestión de información y del conocimiento para la toma de decisiones*. Revista Anales de Investigación.

Sánchez Huerta, D. (2020). *Análisis FODA o DAFO*. Bubok Publishing S.L.

Torres Hernández, Z. (2014). *Administración de proyectos*. Grupo Editorial Patria.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidades 3 y 4: Información en la Empresa; Administración y Herramientas de Administración. (2025). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
